2027年热门会议推荐

具体咨询:白老师 13516196409

智驱产品技术领航

AI 时代产品和软件开发前沿系列峰会

核心定位

锚定AI 技术革新前沿,聚焦大模型与智能体工程化落地,解构 AI 时代软件工程架构革新路径,打通 AI 产品从技术突破到产品商业化验证的全链路。

关键词

- 大模型驱动
- 技术趋势
- Agent工程化
- 架构革新
- AI产品0-1
- 商业化验证

4月 PM×AI 产品力领航者大会

2027年4月23-24·杭州

详情查看官网
演讲申报 | 参会购票

6月 Agentic AICon 智能体应用与架构工程大会

2027年6月18-19·上海

详情查看官网
演讲申报 | 参会购票

11月 Agentic AICon 智能体应用与架构工程大会

2027年11月5-6日·深圳

AI 赋能提质增效

QECon全球软件质量&效能大会

核心定位

聚焦 AI 技术在软件研发全流程的落地应用,以“质量保障&效能提升”为双驱动,助力研发团队实现软件研发的智能化转型。

关键词

- AI 赋能研发
- 效能提升
- 测试驱动
- 平台工具链
- 质量保障
- .....

5月 QECon 全球软件质量&效能大会

2027年5月21-22·深圳

9月 QECon 全球软件质量&效能大会

2027年9月10-11日·上海

10月 QECon 全球软件质量&效能大会

2027年10月15-16日·北京

演讲申报 | 参会购票
详情查看官网

生产级Agent设计蓝皮书·行业案例卷

"蓝皮书共建计划"启动——行业与场景专家 招募中

白皮书定义模式，蓝皮书记录落地。
把你的生产案例，写进行业参照系。
你的案例，很可能是这个行业第一份模式应用实践指南。

交流地点：《艾普·AI生产力研究院》展位咨询

扫码参与



共建计划

以真实案例为基础，持续组织行业与场景的 Agent 设计模式应用撰写。蓝皮书不写概念，只记录具名系统——它面对什么约束、踩过什么失败、为什么这样选架构、哪些经验可以迁移到你的行业。

我们招募这样的行业与场景专家

主导或深度参与过 Agent 系统建设，有真实跑在生产环境的案例；
在强监管、高可靠或大规模部署约束下做过工程取舍（金融、制造、政务、医疗、能源、电商等皆宜）；
愿意把一段经验，沉淀成可评审、可迁移的模式案例。

参与共建，你将获得

署名蓝皮书案例贡献者，成果进入 ADPS 公共技术资料长期存档；
用白皮书的模式语言系统梳理自己的实践，让团队经验成为行业参照；
参与共同体模块研讨与模式评审，共同界定下一版模式的边界；
与已在共同体的腾讯、蚂蚁、百度、京东等一线专家跨行业互审。

《企业级 Agent 设计白皮书》发布

纸质版 & 电子版 同步上线

领取地点:《艾普·AI生产力研究院》展位

Agent 正在从「会回答问题的模型」变成「能参与业务流程的系统」。模型仍是引擎,但决定它在生产中稳不稳的,是周围这套工程结构。本白皮书给出智能体工程的可复用架构词汇与评审标准。



27	7×6	3	5	6
矩阵模式规范	认知功能 × 执行拓扑	横切工程面 X1–X3	工程契约	步选型法

智能体工程的「GoF设计模式」

27个可复用Agent设计模式双轴框架

企业级智能体架构评审与选型实战手册

双轴框架

纵轴 · 认知功能

Agent 在做什么类型的工作

感知 Perception | 记忆 Memory | 推理 Reasoning | 行动 Action | 反思 Reflection | 协作 Collaboration | 治理 Governance

横轴 · 执行拓扑

数据与控制怎么流动

链式 · 顺序 | 路由 · 分流 | 并行 · 并发 | 编排 · 协调 | 循环 · 迭代 | 层级 · 分层

获取白皮书电子版

艾普·AI生产力研究院

Artificial Intelligence Institute of Productivity

Artificial Intelligence Institute of Productivity · 中立 · 开放 · 共创

面向 AI 原生软件工程的开放研究与实践组织

驾驭智能·定义 AI 时代新质生产力

深度承接《"人工智能+软件"专项行动实施方案》的专业化研究与交流平台

软件质量与效能 | **智能体工程与应用** | **六大研究方向** | **五大核心模块**

艾普 · AI 生产力研究院（AIIP）是一个中立、开放、共创的专业化研究与交流平台。研究院依托在软件质量与效能、智能体工程与应用等前沿领域的长期实践积累与前瞻研究底蕴，汇聚资深技术专家与企业研发团队等各方力量，共同推进行业能力体系建设、参考标准研究与评估框架研制，致力于成为支撑智能软件产业新质生产力发展的专业化交流平台。

更多详情请查看官网：https://aiip.org.cn/

关注官网

申请加入

与先行者同行，共赴 AI 生产力浪潮

六大研究方向

AI for SE

智能软件工程

AI赋能软件开发全流程、AI Coding 生产力与质量保障、智能测试工程，对标智能编程工具链与智能化技改。

度量体系

质效度量与治理

AI 质效度量模型、Token 成本治理、ROI 分析框架，以及成熟度评估参考框架的研究与共建。

ADPS

Agent 设计模式

Agentic 设计模式、多智能体架构、AI 系统技术栈与最佳实践沉淀，对标技能包与应用商店。

FDE

前线部署工程师

工程实践方法论、行业场景适配、企业落地案例与效能提升路径，对标就业友好与重点行业落地。

SE for AI

AI 工程化落地

AI 系统全生命周期工程化方法，可靠性与质量保障，以及 MLOps / LLMOps 交付与治理框架。

AI for X

AI 生产力

AI深度赋能千行百业，从软件研发走向办公、运营、数据、科研等真实业务价值场景，把工程能力转化为可度量的生产力。

AI 质效宣言

发起单位：QECon组委会 QECon Organizing Committee

从共识到行动，让宣言融入每一次研发实践

回归研发本质 **重塑人机协作** **推动行业共识**

协作共生 高于 局部取代
长效质量 高于 短期提效
适应进化 高于 固化流程

价值创造 高于 技术崇拜
数据驱动 高于 经验依赖
开放共享 高于 封闭自建

加入共建计划
获取电子画面

两层能力递进 · 一层工程底座

AI 增强软件研发全景架构

AI 嵌入 SDLC · 效能提升

• 人主导 • AI 协同

需求	设计	开发	测试	CI / CD	运维 / 运营
行业调研与趋势分析	代码理解与逻辑探测	代码生成与缺陷解决	测试用例与数据生成	构建与部署脚本生成	告警聚合与摘要生成
创意启发与功能探索	技术选型与架构设计	氛围编程与规约编程	测试脚本修复与自愈	流水线失败诊断与修复	故障分析与定位
需求分析与规格细化	接口设计与数据模型生成	单元测试生成与执行	端到端测试生成与维护	无人值守部署与发版	故障处理与系统自愈
需求检查与内容评审	技术方案评审与风险分析	代码评审与问题修复	缺陷发现与根因分析	依赖升级与漏洞修复	用户体验与反馈洞察

AI 研发范式变革 • 效能跃迁

• AI 主导 • 人监督

工程实践
- 驾驭工程（模型决定上限，Harness 提升底线）
- 知识工程（跨仓库代码与文档索引 · 沉淀复用）
- 验证闭环（生成 → 验证 → 修正）
- 质量门禁（构建多层次质量防护网）

流程重构
- 意图驱动、面向结果的交付（替代多阶段接力）
- 对齐在前、执行在后（人谈清边界，AI 自主实现）
- 需求即规格、证据即信任（规格成为人机契约）
- 快速原型、持续迭代（沿用敏捷 · 精益研发思想）

组织重塑
- 交付层抹平前后端分工（跨栈交付 · 功能负责人）
- 架构师专注标准与门禁（定标准 · 守门禁）
- 设计师与产品自主交付（部分需求不经研发）
- 先锋队试点后规模复制（先跑通再逐步推广）

效能度量
- 结果面：多 · 快 · 好 · 省
- 过程面：渗透率 · 成熟度 · 使用效果
- 数据源：代码 · 会话 · 配置 · 需求 · 监控
- 北极星：需求交付周期 · 单位 token 有效价值

AI 工程底座 • SE4AI（Software Engineering for AI）

• 自下而上 • 决定能力上限

模型层
- 多模型接入与路由（模型网关 · 按能力与成本择优）
- 能力分级与降级（强弱模型分级 · 故障回退）
- 领域微调与私有化（微调训练 · 内网部署）
- 模型评测与选型（基准跑分 · 场景实测对比）

Agent 层
- Agent 架构与编排（单/多 Agent · 规划与控制流）
- 上下文工程与记忆（上下文组装压缩 · 长短记忆）
- 运行时沙盒与工具接入（隔离执行 · MCP 与技能调用）
- 灰度发布与回滚（能力评估达标才放量 · 版本化 · 自动回退）

生态层
- 技能与智能体市场（技能复用 · Agent 共享流通）
- MCP Hub 与工具生态（工具目录 · 权限与调用治理）
- 知识资产与语料沉淀（业务知识 · 代码知识 · 过程知识）
- 检索服务与知识图谱（语义检索 · 图谱关系推理）

贯穿三层 | **安全与治理** 数据脱敏 · 提示注入防护 · 最小授权 · 输出合规 | **可观测性** 决策链路追踪 · 上下文溯源 · 失败归因 | **能力评估** 任务成功率 · 人工接管率 · 单任务成本


为每一位实践者提供一组稳定的价值坐标——当工具在变、模型在变、最佳实践在变的时候，这些原则帮你判断什么是不变的、什么是值得坚守的。

AI 时代的软件质效宣言

新书发布

— 软件工程变革与范式跃进 —

扫码订阅

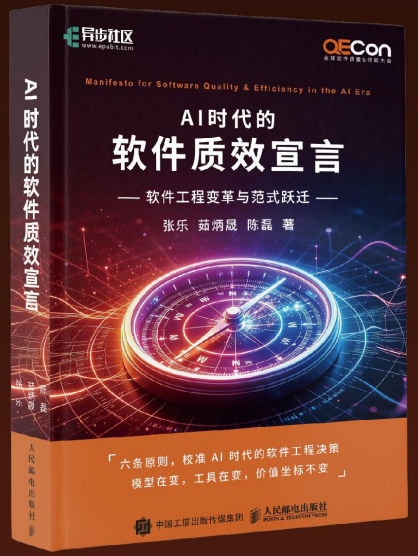

系列电子书结构·三篇十九章 (道 · 术 · 势 —— 一条完整的 AI 研发变革路径)

道

第一篇 · 解读篇 (1-8 章)

确立价值观与原则：理解 AI 时代软件质效的本质，重建研发协作的信念底座，是全书的「道」。

术

即将发布

第二篇 · 单点提效篇 (9-14 章)

覆盖需求分析 → 架构设计 → 编码实现 → 测试验证 → CI/CD → 运维运营的关键环节，打通 AI 赋能研发全链路，是全书的「术」。

势

即将发布


第三篇 · 范式篇 (15-19 章)

当 AI 贯穿整条研发链路之后，组织形态本身将如何变革？从团队结构到协作范式，预见未来，是全书的「势」。

—— 主编 ——



张乐
腾讯
智能化软件工程
资深技术专家




茹炳晟
腾讯研究院
高级技术顾问



陈磊
前京东测试架构师

—— 作者 ——



王玉霞
北京兴云数科
过程改进专家



李佳奇
去哪儿旅行
技术总监



牛万鹏
百度
Comate研发经理



张晔
腾讯端服务质效
技术负责人



张涛
快手质量通道委员



付求爱
华为云
AIOps技术负责人




李萌
珊瑚智成
创始人&CEO



张刚
上海英慕科技
资深技术专家



张兆鑫
OPPO AI架构师



王磊
华为 AI技术专家

主办方：智盟创课

智盟创课（北京）科技有限公司（简称“智盟 Stu.”），作为专业IT产研培训服务供应商与AI时代数字化人才发展伙伴，为科技研发型企业及各类组织提供系统性、分层次、重实战的人才培养解决方案，同时搭建行业前沿技术交流平台，致力于成为企业数字化转型进程中人才培养与业务创新的核心支撑力量，推动组织实现成功转型及经营业绩持续增长。

同时，智盟发起并组织三大 IT 领域品牌会议：QECon 软件质量效能大会、SECon+AgentX 智能时代软件工程技术大会、PMxAI 产品力领航者大会、Agentic AICon 智能体应用与架构工程大会，助力产研中心深化数字化转型、聚焦业务价值达成，在产品研发的快速交付与高质量发展之间找到平衡，打通企业全维度学习视角，最终实现人才能力提升与企业竞争优势增强的双重目标。



详情咨询: 010-65798049

多元化学习形式



核心培训方向



软件研发赋能

大模型前沿	架构设计	数据库	产品经理	持续运维	质量管理
移动开发	组织管理	云计算	开发编程	敏捷开发	大数据

Agentic AICon

Agentic 项目管理新范式
—— 小红书自研 PMOBP Agent

吴汤迅 | 小红书科技有限公司 技术PMO

目录

CONTENTS

01 ／ · 百人项目的协作困局

02 ／ · 驾驭之路 · 多次架构升级

03 ／ · 重构协作 · PMOBP 实战

04 ／ · 持续迭代 · 新展望

05 ／ · Key Takeaway

PART ONE

百人项目的协作困局

缺的不是消息和工具，而是按项目、角色和时效组织起来的可信全貌。

01

百人项目的三个结构性问题

01 • THE DILEMMA

并非谁没有尽责：规模越大，靠人工拼接信息、推进例行事项、传承经验的模式越接近带宽上限

01

信息孤岛

- 信息在群聊、纪要、需求、私聊与文档中；
- 项目中没有任何个体掌握及时、完整、相对准确的全貌；

无人隐瞒，汇总起来仍不完整

02

过程管理全靠人催

- 催办、总结、识别待办与会议纪要占据PMO精力；
- 人员规模越大，人工信息中枢的带宽瓶颈越显著；

重复性工作，挤压复杂协同决策投入

03

经验只存在于人脑

- 优秀 PMO 与新手的差距在于经验：特定情境下反复试错内化的判断力；
- 经验散在个人收藏夹与记忆里，无法规模化复用；


关键PMO离开，项目认知断层

增员解决不了结构性问题； PMO 团队规模精简却要支撑庞大研发体系 ——
必须用 AI Native 的路径重塑协作方式

真实案例：交付链路险些中断

01 • COMPOSITE CASE

案例为真实场景 · 典型的百人项目信息孤岛

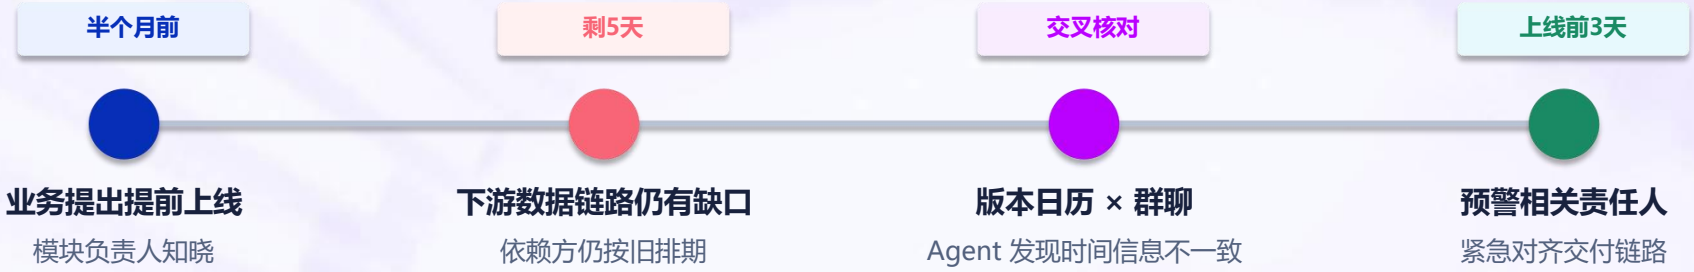

事件发生

- 某数百人协作项目，一模块因业务需要提前两周上线
- 模块负责人知晓此事，但下游数据模块并不知情
- 距全量开放仅剩 5 天，数据链路仍有大量缺口
- 无人主动提出，并非有意隐瞒，而是无人意识到 "该信息应当同步给谁"

PMOBP 解决思路

① 持续监控项目群聊 + 定时读取文档中的版本日历

② 注意到某模块上线时间已提前，交叉比对相关群消息

③ 发现数据模块所在的群还在按原定时间讨论排期

④ 上线前 3 天自动预警到对应的人，交付链路紧急对齐

信息中枢的价值：信息已经存在、无人隐瞒；缺的是识别依赖方并把变更推到“该看到的人”。

Agentic 项目管理新范式

01 • THE SHIFT

AI时代的项目管理：不只是把Agent当工具，而是真正从协作模式上重构

思维转变

工具思维：将 AI 视为效率插件 —— 周报撰写更快、文档检索更快，协作模式不变

驾驭思维：把 AI 当协作模式的组成部分 —— 信息如何流动、人力如何分配、经验如何沉淀

1

人管项目

人当信息中枢；靠个人经验驾驭不确定性

→

2

人驾驭 AI

Agent接管Routine；人管目标/组织/风险与决策

→

3

AI主导、人裁决

Agent主动提出建议；人来做关键裁决

→

4

有限自治

中小项目的常规工作自动运行，人退到治理与边界定义

项目管理四阶段演进 —— 当前我们处在 Stage 2 后期，正向 Stage 3 迈进

PART TWO

驾驭之路·多次架构升级

02

从 v1.0 到 v5.0：每一次换挡，都不是简单地“加点功能”，而是基于业务驱动的架构级迁移。

五次架构跃迁：业务驱动的演进路径

02 • ROADMAP

并非事先绘就的蓝图，每一步都是结合新技术、新问题，贴近真实工作场景，从架构层级重构来不断重塑项目管理工作流。

v1.0 • 2025 Q1

AI 顾问

Prompt Engineering
+ 知识库 RAG

会说，不会做

→

v2.0 • 2025 Q2 ~ Q4

Workflow Agent

Context Engineering
+ 规划及执行能力

规范性 ↔ 可扩展性矛盾

→

v3.0 • 2026 Q1

OpenClaw 分身

Harness Engineering
+ 项目主数据平台

实例信息混杂，准确性难辨

→

v4.0 • 2026 Q1 ~ now

项目专属 BP

Knowledge Engineering
+ 角色感知

知道事实，但不懂行

→

v5.0 • 探索中

自进化领域专家

Cognition Engineering
+ 经验库与自我迭代

主动式 Agent

判断该不该升档的信号：当前瓶颈靠“再加点功能”已经解不掉 —— 瓶颈是架构性的，解法就必须是架构性的

v1.0 AI 顾问：先让 AI 会答项目管理问题

02 • V1.0 • AI ADVISOR

Prompt Engineering + 知识库 RAG：先让 AI 认识“项目管理”

定位与切入点

- 定位为项目管理顾问：稳定回答领域基础问题
- 高频且易做，适合先验证可用性
- 三步走：
  → 沉淀最佳实践入库
  → 高频实践做产品工具化
  → 高频场景叠加 AI 能力

用户问题 → 意图识别 → 知识检索 RAG → 生成回答

留下两件长期资产

- 50+ 代表性评测用例、准/召率基线 —— 评测从第一天就建立
- 知识标注适用边界：如"轻量 KO 模板适用 5-15 人非 S 级项目"


天花板：能建议“怎么做”，但还不能替用户完成任务

- 用户需要的不只是答案，更是任务的实际完成
- 由此催生 v2.0：让 Agent 具备执行能力

v2.0 多Workflow Agent：从“会说”走到“会做”

02 • V2.0 • WORKFLOW AGENT

Context Engineering：意图路由 → 上下文构建 → 主 Agent 规划 → 五个 Workflow。

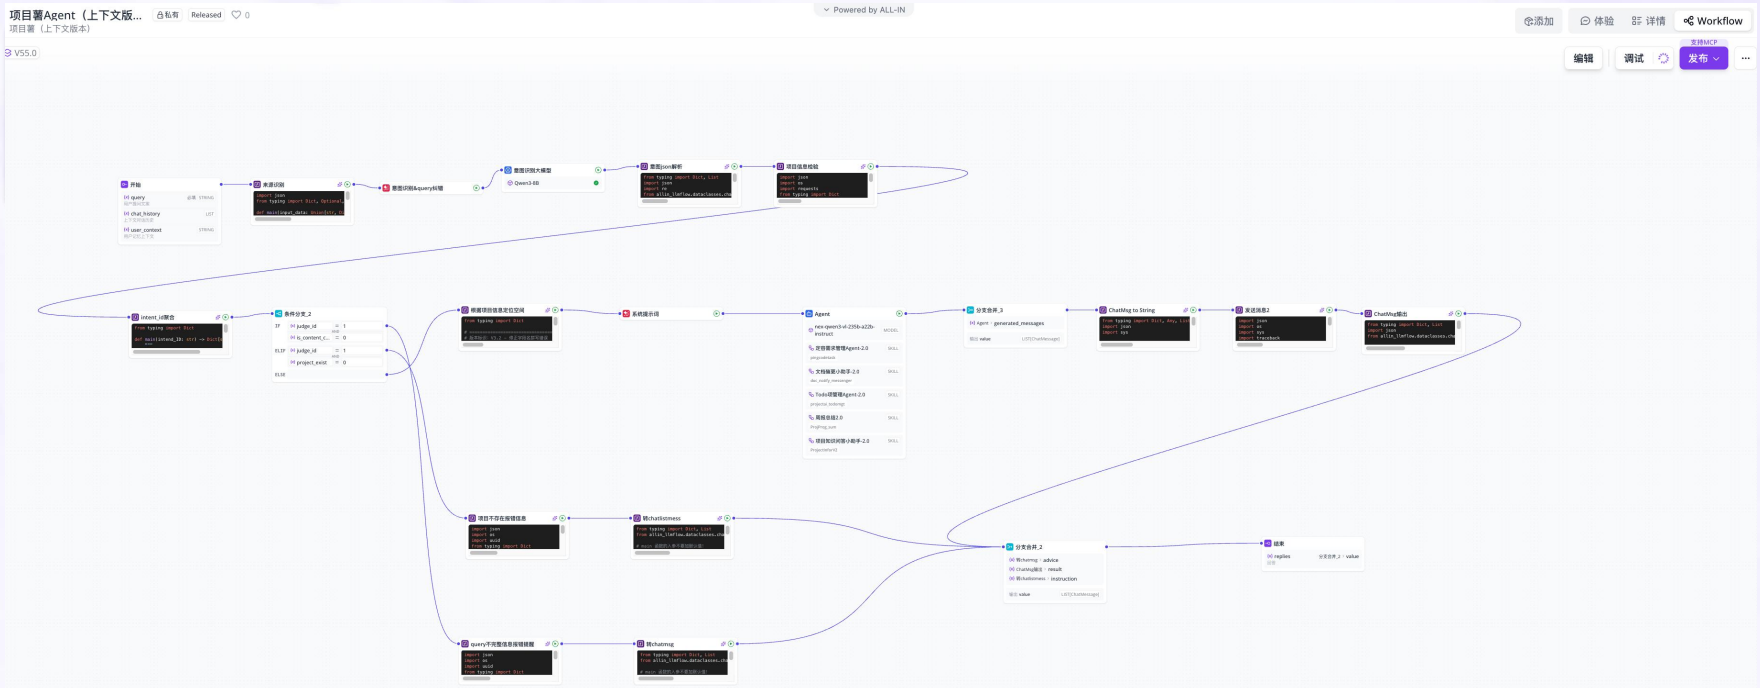

v3.0 OpenClaw 分身：把 Agent 驻进工作现场

02 • V3.0 • OPENCLAW 分身

Harness Engineering：主数据、个人分身和团队实例把 Agent 放进真实协作链路。





工程护栏

隔离 • 白名单 • 监控 • 安全提醒 • 操作审计

新瓶颈：项目实例信息混杂、准确度难辨；“每个项目建一个 Agent”不等于共享可信知识

PART THREE

重构协作 · PMOBP 实战

同一份项目事实，多种角色视角 —— L1~L5 五层架构、知识自沉淀与信息可追溯。

03

L1~L5 核心架构：共享上下文 + 角色感知

03 • CORE ARCHITECTURE

围绕"多源摄取、共享上下文、角色感知"三项工程挑战逐层拆解出 L1~L5

L5	**个人 Agent • 隔离中共享**	管理者 / 负责人 / 成员 各自Session 共享同一份项目上下文，对话历史互相隔离
L4	**角色感知注入 • 三层渐进检索**	公共 KB → 项目档案 → 各渠道直读；角色模版裁剪：同一份事实，不同角度
L3	**共享知识库 • Git + Markdown**	methods · decision-trees · cases · glossary · projects/（项目档案多项目隔离）
L2	**动态上下文贡献 • 双路调度**	实时写入（秒级，时效请求触发）+ Auto Dream（每日凌晨沉淀）
L1	**多源摄取 • 5 渠道 Adapter**	会议纪要 · Doc 文档 · IM 群聊 · IM 私聊 · 需求管理工作项 → 统一 Context Chunk

一句话串起来：多渠道归一摄取 → 双路调度 → 五层知识库 → 角色裁剪 → 隔离中共享 —— 底座同一份事实，出口 N 种角色视角

KEY INSIGHT：**不仅给每个人配项目助理，同时也给「这个项目」也配一个 BP**

角色感知：同一份事实，N 种角色切片

03 • ROLE-AWARE

同一个问题落在不同人的不同渠道里，对不同角色给出不同话术与视图 —— v4.0 最关键的一层

问 PMOBP："项目当前进展如何？"

实现方式：三层渐进检索（稳定通用知识 → 项目档案 → 各渠道实时直读）+ 角色模板裁剪

管理者

哪些项目今天要升级决策?

里程碑全景

整体健康度、关键节点

跨项目对比

多项目进展与风险发现

项目负责人

核心功能何时上线？卡点和依赖在哪?

依赖链与阻塞点

谁卡住了谁

项目要素

Todo / 进展 / 风险的读写操作

项目成员

我负责模块的节点是什么？上下游是谁承接?

技术方案 / 需求管理系统

与我相关的变更与预警

项目主数据

群聊信息带入个人记忆，私聊不外泄

角色感知本质是在处理"不同工作处在不同演进阶段"：AI 主导例行工作，人驾驭关键决策

Auto Dream：让知识库自生长

03 • AUTODREAM

白天清醒、夜里做梦 —— 实时响应与周期沉淀各司其职

为什么需要 Auto Dream：

- 靠人工维护的知识库注定追不上项目变化；大量知识库建设完善，但三个月后无人维护，半年后内容过期
- 关键不是建多大的库，而是让库具备自生长能力

实时路径 • 白天Heartbeat

让刚发生的事情查得到

- 纪要 / 群聊 / 工作项进入上下文
- 高时效问题优先读来源
- 让变更及时触达有依赖的角色

周期沉淀 • 凌晨 autodream

让阶段性结论持续积累

- 整理、去重、归并、提炼
- 把决策及原因连回来源
- 过时状态标记，冲突不静默覆盖

一个新立项项目的两周

周一：启动会纪要提炼出项目目标与三个里程碑 → 周三：技术评审沉淀"选型 A 否决 B"及原因 → 周四：群聊提炼"前端依赖设计稿" → 周五：私聊让风险表多了一条"设计资源可能不足"

两周后有人问"这个项目现在什么情况"，Agent 基于完整档案作答 —— 而这份档案不需要手动维护

敏捷模式：Pod 三层结构，信息组织即运作方式

03 • TWO MODES

没有评审会 —— PMOBP 成为团队的实时信息中枢，革新传统需求管理系统

Pod Cluster

全局唯一 • 管理者全局视角

- 全局查看各 Pod 健康度与风险状态
- 增量价值产出节奏一览
- 对应管理者"哪些风险升级到我"的诉求

Pod

闭环小团队 5-10 人

- 业务/产品/研发/Agent/模型全角色
- tags 打标签分群
- 为某一个方向持续做功

Feature

执行单元

- product / tech 两类
- Feature owner 1:1 端到端
- 以 Feature 拉动迭代

四类典型交互 • 复用 L0→L1→L2 三层数据架构

① Pod 成员上报：@agent → Feature 级更新 → git 自动写入　② Owner 查进展：tasks 依赖视图 + blocked 溯源

③ 时间驱动提醒：task.eta / risk 未处理 / status 长期不变　④ 管理者跨 Pod 查询：版本视图 / tag 过滤 / root cause 下钻

知识工程：可增量编译的项目知识链路（Wiki + Graph）

03 • KNOWLEDGE ENGINEERING • NEW

人读 Wiki 叙述，机器连 Graph 关系；每条断言都能回到原文证据——为战略层度量打地基

过去：Git + Markdown 文档

- 项目事实埋在纪要段落里，跨会要对齐靠人翻
- 同一个人/风险散落多处文档，拼不出全貌
- 风险过期没人知道，Todo 跟踪靠记忆和 Excel

现在：Wiki + Graph 三要素知识网络

- 底层沉淀 Entity / Concept / Source，呈现层聚合 Todo / Progress / Risk
- 人、团队、里程碑自动建成实体，关系一跳可见
- 每条要素挂证据与时间：可信、可下钻、会保鲜

对项目管理的五个作用

项目内：事实对齐	项目间：风险关联分析	人的实体与标签	风险与 Todo 保鲜	内容结构化
“M2 为什么延期、谁被阻塞”不再翻纪要，一跳查到结论+证据链	图谱连通项目间关系，可分析：同一负责人 / 依赖牵连哪些项目，连锁影响一眼看清	自动生成“负责人A”实体：tag 负载高、跨项目可查	Todo 自带 Owner 和 DDL，Risk 带证据会降权提示，不靠记忆	纪要不再是一篇篇文档，而是字段化的知识：可查询、可统计、可计算

成为后续能力的底座：各渠道（纪要 / 周报 / 群聊 / OKR）的增量信息有处可落 —— 正是下一页 Enrichment 的起点

知识图谱：项目事实围绕三要素聚合

03 • KNOWLEDGE ENGINEERING

ENTITY • PROJECT

XX 项目

健康度：● 黄灯　最近更新：10-19

关键风险（Risk）

M2 因接口依赖延期
影响：联调排期 + 负责人 A
evidence: XX 项目周会

三要素实体（呈现层）


Todo　接口联调 · Owner A
Progress　M1 达成 · 依据周报
Risk　M2 延期 · 阻塞 X 团队

证据锚点

每条断言回指原文片段
进展 / 风险 / 决策可下钻来源
冲突显式暴露，不静默择一

Way1: 常规信息问答　通过大模型推理得出

底层：原始事实沉淀为三类节点　86 nodes · 143 edges

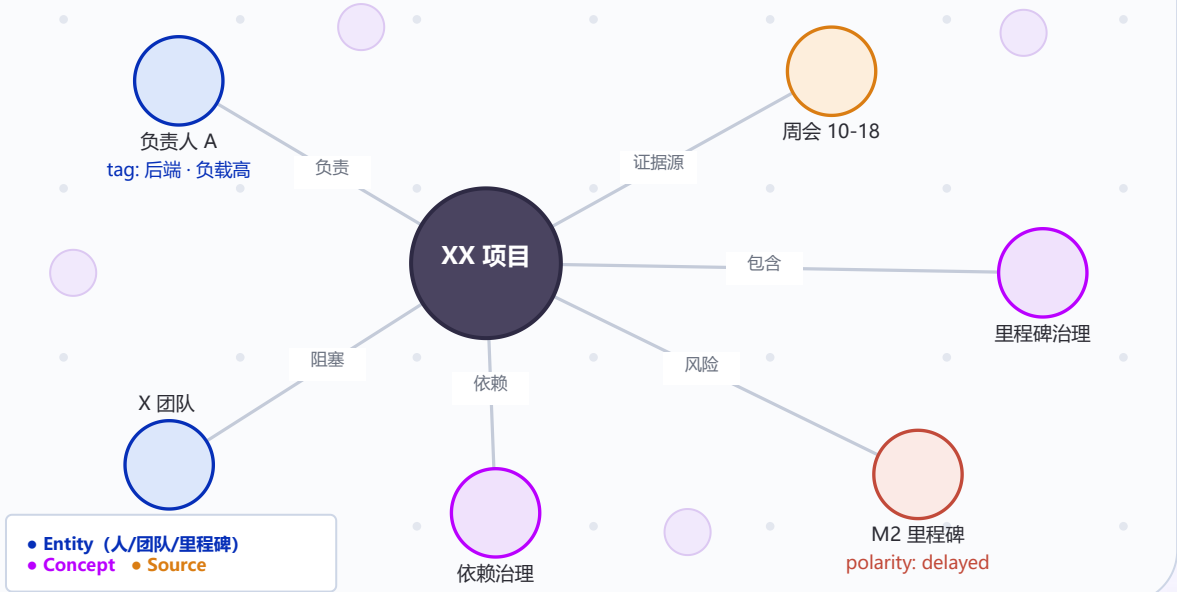

Way2: 高频场景

高频、确定性查询
-> 直接反馈预聚合页面

Todo
接口联调 · Owner A · 10-20

Progress
M1 达成 · 依据周报

Risk
M2 延期 · 阻塞 X 团队

Context 的逐渐丰富：从单点文档到全域项目记忆

03 • CONTEXT ENRICHMENT

信息源一步步接入同一条知识链路；每接入一类，Agent 对项目的理解就完整一分

端到端链路：纪要自动流入项目知识库（全程用户无感知）

① 会议系统
纪要生成 → MQ 推送
不做业务过滤
高敏会议按密级过滤

→

② 知识工程
消费 MQ →
进行会议 & 项目mapping

→

③ 抽取入库
权重判定 →
权重高：自动入库 Wiki + Graph
权重低：开启人工校验链路

→

⑤ 项目知识库
1. Project / Person等实体更新
2. 进展/ Todo / 风险：聚合沉淀

项目归属判定：四信号加权融合

S1 参会人重合度
参会人 ∩ 项目成员 / 成员数

S2 标题语义
项目名 / 项目别名 / 关键词命中

S3 关联群匹配
项目绑定群精确命中 → 加分

S4 现有Wiki
内容（todo/risk/progress）相似度

融合：总分 = Σ(权重×得分)，取最高分项目 · 高置信直接入库 / 中置信冷启动不入库 / Top1-Top2 差距<ε 判歧义 → 私聊组织者 / 零命中丢弃

过去 **周报 / 项目文档**

人工整理、更新滞后；纪要散落平台，未归档项目知识库

现在 • 已打通 **会议纪要自动入库**

零操作默认：结论 / Todo / 风险 + 置信度 + 命中依据直接入库

下一步 **多渠道逐步接入**

群聊 / OKR / 需求平台接入同一链路，同一套知识层直接复用

三个关键设计决策

① 全量推送 + 智能路由：纪要统一进知识工程中控，用户零感知
② 密级优先：高敏会议按权限收窄，先过滤后入链路
③ 双重保险：入库侧用图谱再验归属，与判定结论冲突则发信人工校准

PMOBP 已落地的能力矩阵

03 • CAPABILITY MATRIX

PMOBP 当前已具备的能力 · 四大能力族

INFO • 进展管理

- 从知识库秒读项目快照 · 按角色总结进展及关注事项
- 支持下钻到实时进度 · 跨项目进展总结及风险发现

OUTPUT • 内容生成

- 一键创建标准项目目录 · 各类模板获取及定制化修改
- 例会文档自动接续并更新到会邀 · 定时刷新项目一张图 HTML

COLLAB • 协同执行

- 代发私聊消息（附署名标识）· 群内广播 / 定时任务精准催办
- 自动入群、建群、约会议并绑定项目 · Todo / 进展 / 风险读写

EVOLVE • 自进化（v5.0 探索）

- 记忆系统 + 经验库：把 PMO 经验蒸馏成可加载的 SOP
- 自我迭代：触发→检索→修正→评测，从"知道事实"到"懂行会判断"

20+ 核心能力　**400+** 覆盖项目数　**8K+** Skill 下载　**3 端** IM / Web / TUI 互通

PART FOUR

持续迭代·新展望

04

以评测驱动效果迭代，以平台承接战略落地，以认知工程沉淀组织经验。

展望一：评测系统

04 • 展望一 • EVALUATION

Context扎实、评测护航 —— 让 Agent 接管项目管理的钥匙

场景用例 → 查询 / 待办 / 沟通 / 文档

明确标准 → 结论 / 证据 / 权限边界

自动回归 → PASS / FAIL / PARTIAL

Bad Case 回流 → 修复 → 再测 → 留回归集





评测体系是能穿越模型代际的投入：模型每半年上一个台阶，但"知道 Agent 变强还是变弱"的度量能力不会贬值

展望二：战略落地管理平台 AISMO

04 • 展望二 • AI SMO

定位：战略落地的读取层

上一代解决"项目信息怎么填进来"；AI SMO 解决"战略落地情况怎么看得清楚"——填的动作由 PMOBP 知识工程承担，平台只负责组织与度量。



战略承接链（Graph 承载）

O / KR	目标 · 关键结果
KA	关键行动 · 承接枢纽
Matter	项目 | 事情

SMO 独有的三个度量

- 承接完整性：有没有"喊了没人接"的 KA
- 承接深度：分解是否过深或过浅
- 孤儿事项率：在做但不在战略里的投入
- 前置：KA 覆盖率不足时指标标"数据不完整"

三档视角

- VP：战略达成 + 健康度大盘
- 二级部门管理者：与我相关的项目与承接
- 项目负责人：事项详情，扣分项可下钻证据

展望三：认知工程，从 MVP 到智能化

04 • 展望三 • COGNITION ENGINEERING

先建立"可存储、可检索、可确认、可失效"的闭环，再逐步演进

第一期 • 经验库

把“怎么判断”沉淀成可复用资产

- 纯 Markdown + 索引 + 脚本起步，零额外基建
- 经验库 / SOP 库两层分库，按场景类型组织（启动·执行·收尾 × 会议·过程）
- 1S·4W·2H 模板 + confirmed / drafts 两级存储
- 场景路由表 + Stage / Who 索引；被证伪的经验自动降权

第二期 • 记忆动态化

让 Agent 从复盘中修正打法

- 定时任务 + Agent 编排，让记忆自己转起来
- 里程碑 / 延期 / 判断偏差三类事件触发复盘
- Outcome 延迟回填（待回填队列 + 到期重访）；drafts 定期 GC 回收
- 干系人画像库带时间戳与来源项目；检索→适配→执行→回填编排闭环

第三期 • 智能化

从执行者走向会总结的伙伴

- Embedding 语义相似度检索，作路由表未命中的兜底
- Cron / Heartbeat 驱动定期复盘，自动触发调度
- 客观 Outcome 判定经验有效或证伪
- 置信度全自动升降，减少人工确认负担

当 Agent 拥有项目记忆之后，它还缺什么？

答案不在更多工具里，而在 Agent 如何主动形成自己的“管理认知”

Part 5: Key Takeaway

Agentic AICon

1. **困局是结构性的，增员解决不了**
   信息孤岛加人工中枢是百人项目的根因，出路是重构协作模式，不是加人

2. **主数据优先于场景，做领域的 Source of Truth**
   没有可靠的项目主数据，模型再强也只是猜测；能穿越模型代际的投入才是真壁垒

3. **评测体系让 Agent 可信**
   先为想衡量的目标建立可靠度量，评测跟着每代架构一起迭代；不评测，就不知道 Agent 是变强还是变弱

4. **真正的瓶颈是 Context，不是模型**
   模型能力已足够强，制约在 Context Bottleneck；把知识上下文做扎实，才能让 Agent 真正接管项目管理

5. **业界领先，靠 AI Native 重塑工作方式**
   团队未增员、无额外研发资源，靠 AI Coding 自主完成了架构跃迁；工程不再是创造的桎梏，有想法就动手

让 Agent 接管项目管理的钥匙，不是更强的模型，而是把领域 Context 做扎实——数据可信、评测护航、人人皆可为 Builder。

Agentic AICon

智能体应用与架构工程大会



《项目管理红宝书：小红书PMO Agentic项目管理实战》

已在微信图书、京东读书上架

欢迎在座各位阅读与交流！

AgenticAICon

智能体应用与架构工程大会

感谢聆听

关注公众号

更多会议详情
